

SYSTEME RÉSERVATION D'HÔTEL

EQUIPE:

BENOMAR WIJDANE
BENRHALEM YOUSRA
ESSRAI ABDELALI
SALAMI MARYAM

PARTIE 1

Application Web de Réservation – Blue Wave Hotel.

1- Équipe & Rôles Scrum

Nom & Prénom	Rôle Scrum
Essria Abdelali	Scrum Master
Benrhalem Yousra	Product Owner
Benomar Wijdane, Salami Meryam	Développeur

2- Objectif du projet

Le projet consiste à développer une application web pour le Blue Wave Hotel permettant aux utilisateurs de consulter les chambres disponibles et effectuer des réservations en ligne.

L'objectif est de faciliter le processus de réservation, améliorer l'expérience utilisateur et augmenter la visibilité de l'hôtel sur internet.

3- Public cible

Les voyageurs souhaitant réserver une chambre d'hôtel en ligne rapidement et facilement.

4- Rappel du livrable 2

Durée totale estimée : 12 semaines

Nombre de sprints : 3 à 4 sprints

Vélocité estimée : 6 à 8 story points par sprint et par développeur

PARTIE 2 — Product Backlog initial

1- Product Backlog – Blue Wave Hotel

ID	User Story	Critères d'acceptation	Points	Priorité	Sprint
US1	En tant qu'utilisateur, je veux m'inscrire afin	Formulaire valide ; message de succès affiché	3	Must	Sprint 1
US2	En tant qu'utilisateur, je veux me connecter	Email/mot de passe corrects ; message d'erreur sinon	3	Must	Sprint 1
US3	En tant qu'utilisateur, je veux consulter les	Liste affichée ; informations visibles (prix, type)	5	Must	Sprint 1
US4	En tant qu'utilisateur, je veux réserver une	Dates valides ; confirmation affichée	5	Must	Sprint 2
US5	En tant qu'utilisateur, je veux consulter mes	Liste affichée ; informations correctes	3	Should	Sprint 2
US6	En tant qu'administrateur, je veux ajouter une	Formulaire fonctionnel ; chambre ajoutée en	5	Could	Sprint 3
US7	En tant qu'administrateur, je veux modifier une	Modification enregistrée ; affichage mis à jour	5	Could	Sprint 3
US8	En tant qu'utilisateur, je veux filtrer les	Filtre fonctionne ; résultats corrects	3	Could	Sprint 3
US9	En tant qu'utilisateur, je veux me	Session supprimée ; redirection vers login	2	Must	Sprint 1
US10	En tant qu'utilisateur, je veux voir les détails	Informations complètes ; affichage clair	3	Should	Sprint 2

PARTIE 3 — Planification des Sprints

1-Vue d'ensemble des sprints

Sprint	Période	Sprint Goal	User Stories incluses	Total Points
Sprint 1	Sem 1 – Sem 2	Mettre en place authentification + affichage	US1, US2, US3, US9	13
Sprint 2	Sem 3 – Sem 4	Implémenter réservation et consultation	US4, US5, US10	11
Sprint 3	Sem 5 – Sem 6	Ajouter fonctionnalités admin et filtres	US6, US7, US8	13

2-Sprint Backlog détaillé

Sprint 1

Authentification + consultation chambres

User Story	Sous-tâche	Responsable	Estimation (h)	Statut
US1	Créer formulaire inscription (JSP)	Wijdane	4h	Terminé
US1	Implémenter insertion utilisateur (DAO)	Wijdane	5h	Terminé
US2	Créer formulaire login	Wijdane	3h	Terminé
US2	Vérification login (Servlet + DB)	Wijdane	5h	Terminé
US3	Afficher liste chambres	Wijdane	6h	En cours
US9	Implémenter logout	Wijdane	2h	Terminé

Sprint 2

Réservation

User Story	Sous-tâche	Responsable	Estimation (h)	Statut
US4	Créer formulaire réservation	Maryam	4h	Terminé
US4	Enregistrer réservation (DAO)	Maryam	5h	En cours
US5	Afficher mes réservations	Maryam	4h	À faire
US10	Page détail chambre	Wijdane	3h	À faire

PARTIE 4 — Simulation des cérémonies Scrum

1-Sprint Planning (Sprint 1):

Participants :

- Scrum Master (Essria Abdelali)
- Product Owner (Benrhalem Yousra)
- Développeur (Benomar Wijdane+ Salami Meryem)

Durée : 1h

Sprint Goal :

mettre en place une authentification fonctionnelle et afficher la liste des salles

User Stories sélectionnées :

US1, US2, US3, US9

Justification :

Ces User Stories sont prioritaires (Must) car elles représentent les fonctionnalités de base nécessaires au fonctionnement de l'application : authentification et consultation des chambres.

Risques identifiés :

- Difficulté avec la connexion à la base de données
- Problèmes d'authentification (sessions)

2-Exemple de Daily Scrum

Membre	Qu'ai-je fait hier ?	Que vais-je faire aujourd'hui ?	Blocages
Yousra (PO)	Définition des User Stories	Vérification des besoins	Aucun
Abdelali (SM)	Organisation du sprint	Suivi de l'équipe	Aucun
Wijdane (Dev)	Création formulaire login	Implémentation Servlet	Problème connexion BD

3-Sprint Review

Fonctionnalités livrées :

- Inscription utilisateur
- Connexion
- Affichage des chambres

Retour du Product Owner :

Le système fonctionne dans son ensemble, au moins grâce à son interface utilisateur dans un premier temps.

Fonctionnalités non terminées :

Logout (retard technique).

Vélocité réelle :

11 Story Points complétés sur 13

4- Sprint Rétrospective

Start (à commencer)	Stop (à arrêter)	Continue (à continuer)
Mieux répartir les tâches	Travailler sans planification	Bonne communication
Tester régulièrement	Reporter les problèmes	Collaboration équipe
Faire des réunions courtes	Retard dans certaines tâches	Respect des rôles

PARTIE 5 — Definition of Ready (DoR) & Definition of Done (DoD)

1-Definition of Ready (DoR)


#	Critère	Dimension
1	La User Story est rédigée au format "En tant que..., je veux..., afin de..."	Compréhension
2	Les critères d'acceptation sont définis et testables	Qualité fonctionnelle
3	La User Story est estimée en Story Points	Planification
4	Les dépendances techniques sont identifiées	Technique
5	L'équipe comprend clairement le besoin	Communication
6	La priorité (MoSCoW) est définie	Organisation

1-Definition of Ready (DoR)

#	Critère	Dimension
1	Le code est développé et fonctionne correctement	Développement
2	Les tests sont réalisés et validés	Tests
3	Aucune erreur critique n'est présente	Qualité
4	Le code est relu (review) par un membre de l'équipe	Qualité code
5	La fonctionnalité est intégrée dans l'application	Intégration
6	L'interface utilisateur est fonctionnelle et utilisable	UX
7	Le code est documenté (commentaires)	Documentation
8	La fonctionnalité est déployée sur le serveur local (Tomcat)	Déploiement

PARTIE 6 — Suivi et indicateurs

Burndown Chart idéal (Sprint 1)

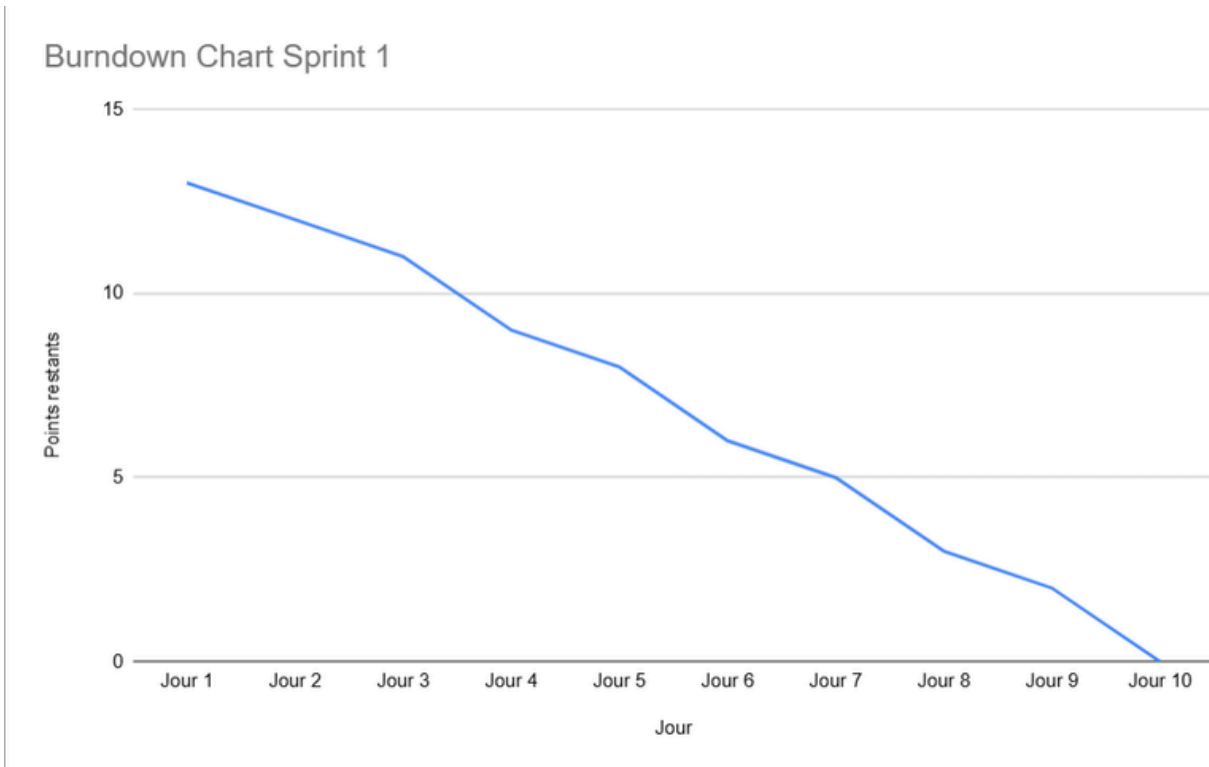

2-Outils de gestion de projet

Outil	Utilisation	Justification
Jira	Gestion backlog + sprints	Suivi des tâches Scrum
GitHub	Versioning du code	Collaboration équipe
VS Code	Développement	Outil simple et efficace
MySQL	Base de données	Stockage des données
Apache Tomcat	Serveur	Exécution application JEE

3-Analyse des risques liés à Scrum

#	Risque	Mesure de mitigation
1	Manque de disponibilité des membres (étudiants)	Planifier des réunions régulières et répartir les tâches
2	Mauvaise estimation des User Stories	Ajuster la vélocité et améliorer les estimations

PARTIE BONUS — Kanban & Comparaison Scrum / Cascade

Bonus A : Tableau Kanban (Sprint 1)

Sprint 1 : Authentification + affichage des chambres

To Do	In Progress	Review	Done
Créer formulaire inscription	Implémenter login (Servlet)	Vérification connexion BD	Formulaire login
Implémenter DAO utilisateur	Affichage chambres	Test affichage chambres	Inscription utilisateur
Implémenter logout		Revue code login	

Bonus B : Comparaison Scrum / Cascade

L'approche Scrum est plus adaptée au projet de réservation d'hôtel Blue Wave Hotel que le modèle en cascade. En effet, ce projet est évolutif et nécessite des ajustements fréquents selon les besoins des utilisateurs, ce qui correspond bien à la flexibilité de Scrum. Grâce aux sprints, l'équipe peut livrer progressivement des fonctionnalités comme l'authentification, la consultation des chambres et la réservation, tout en recevant des retours réguliers.

Contrairement au modèle en cascade, où toutes les étapes sont réalisées de manière séquentielle et rigide, Scrum permet une meilleure gestion des changements. Par exemple, si une fonctionnalité doit être modifiée ou améliorée, cela peut être intégré dans un sprint suivant sans bloquer tout le projet.

De plus, Scrum favorise la communication entre les membres de l'équipe à travers les réunions (Daily Scrum, Sprint Review), ce qui réduit les risques d'erreurs. Enfin, étant donné que l'équipe est composée d'étudiants avec une disponibilité limitée, Scrum permet une organisation plus flexible et adaptée à leur rythme de travail, contrairement à l'approche en cascade qui demande une planification stricte dès le début.

